Vorabinformation der Verwaltung zum Antrag der SPD-Fraktion vom 11.06.2025 zur transparenten Kommunikation zum Glasfaserausbau durch die UGG

Zu dem vorliegenden Antrag kann die Verwaltung für die Beratungen im Verbandsgemeinderat folgende Vorabinformation erteilen:

Zu 1.:

Mit Stand Juni wurde ein aktueller unverbindlicher Projektplan, u.a. mit Angaben der Umsetzung noch notwendiger Wasserquerungen und zur Fertigstellung des Projektes nach Ortsgemeinden bereitgestellt. Ein Runterbrechen auf Straßenzüge ist nicht vorgesehen, da die jeweilige Gemeinde zu einem Termin an das Netz angeschlossen wird. Obiger Projektplan wird dem Rat in Sitzungsdienstprogramm unter diesem TOP zur Verfügung gestellt.

Grundsätzlich sollen die (genehmigten) Gewässerquerungen in den nächsten 3 Monaten fertiggestellt sein. Soweit noch Schäden auf den LWL-Leitungen dann festgestellt werden, sind diese anschließend umgehend zu beheben. Danach kann dann Licht auf die Leitungen gegeben und das Netz wird an die Telefonica übergeben werden. Hier erfolgt dann die Aktivierung der Anschlüsse und auch der Bau der restlichen Hausanschlüsse, die noch fehlen. Hierfür wird eine Bauzeit von 3-4 Monaten geschätzt, bis der überwiegende Teil der Anschlüsse in Betrieb ist.

Auf dieser Grundlage geht man davon aus, dass voraussichtlich Ende des Jahres 2025 die meisten Kunden über Glasfaser verfügen können.

Derzeit noch fehlende Genehmigungen zur Lahnquerung in Bad Ems und Obernhof und fehlende Genehmigungen zur Querung der Bahnlinien in Nassau und Dausenau sowie Obernhof durch die Bahn können zu Verzögerungen führen und sind nicht zeitlich kalkulierbar. Insoweit wird der Bauzeitenplan diesbezüglich unverbindlich bleiben, weil man zwar die Bauzeiten kalkulieren kann, aber nicht die Genehmigungszeiten. Aktuell wird unverbindlich mit 6 Monaten gerechnet.

Der Anschluss der Gebäude (Hausanschluss) ist unabhängig vom Tiefbau. Dieser erfolgt oft mit Fremdfirmen, teilweise durch den Generalunternehmer, teilweise durch die UGG selbst. Hier ist durch die UGG nicht abschätzbar, wann wo konkret gebaut wird; die Aufträge werden über Ausschreibungen europaweit vergeben.

Nach Fertigstellung der derzeit im Ausbau befindlichen 1. Welle wird die UGG bzw. die Telefonica in einer 2. Welle die restlichen Anschlüsse (Mehrfamilienwohnhäuser, inaktive Anschlüsse bzw. nachträglich eingegangene Aufträge) umsetzen und aktivieren.

Zu 2.:

Nach Annahme des Antrages wird mit der UGG eine gemeinsame Pressemitteilung zum Ausbaustand und den Erkenntnissen aus Ziffer 1 für die Bevölkerung vorbereitet und veröffentlicht.

Weiterhin wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, sich ggfls. rechtzeitig um Hauselektriker zu bemühen, falls im Haus die Verkabelung erneuert werden muss. Die UGG erledigt nur die Verbindungen bis zum Glasfaserabschlusspunkt im Haus (ONT) und verlegt keine Kabel im Haus.

Die Presseerklärungen werden gegenseitig abgestimmt und auf allen Print- und Internet-Medien bekannt gegeben.

Mit der UGG ist vereinbart, eine weitere Werbeaktion durchzuführen, die bis zum 31.08.25 in verschiedenen Gemeinden läuft. Dort können die Bürgerinnen und Bürger noch kostenlose Hausanschlüsse erhalten und beauftragen.

Neben O2 werden zwei weitere regionale Anbieter das Netz bedienen. Es handelt sich dabei um die Anbieter „amiva“ und „leonet“. Die Konditionen zu den Tarifen sind auf der Internetseite der UGG einsehbar.

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Bad Ems, 03.07.2025

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister

Phoenixen

We connect.

Quartalstreffen VG BEN

Juni 2025

17.06.2025

© 2025 Phoenix Engineering GmbH

Agenta

1. Aktualisierung Schadensbehebungen
2. Übersicht Außerorts
3. Wasserquerungen BZP
4. Fertigstellung des Projektes

© 2025 Phoenix Engineering GmbH

Aktualisierung Schadensbehebungen

Projekt	Erledigt	in Bearbeitung
Bad Ems	0	1
Frücht	2	2
Miellen	0	0
Arzbach	0	1
Seelbach	0	1
Nassau	4	5
Dienethal	0	0
Zimmschied	1	1
Geisig	0	0
Weinähr	4	0
Sulzbach	0	0
Pohl	0	0
Schweighausen	0	1
Dornholzhausen	0	0
Misselberg	0	0
Lollschied	0	0
Obernhof	1	1
Dausenau	1	0
Kemmenau	0	0
∑	13	13

Phoenixen

We connect.

© 2025 Phoenix Engineering GmbH

Übersicht Außerorts

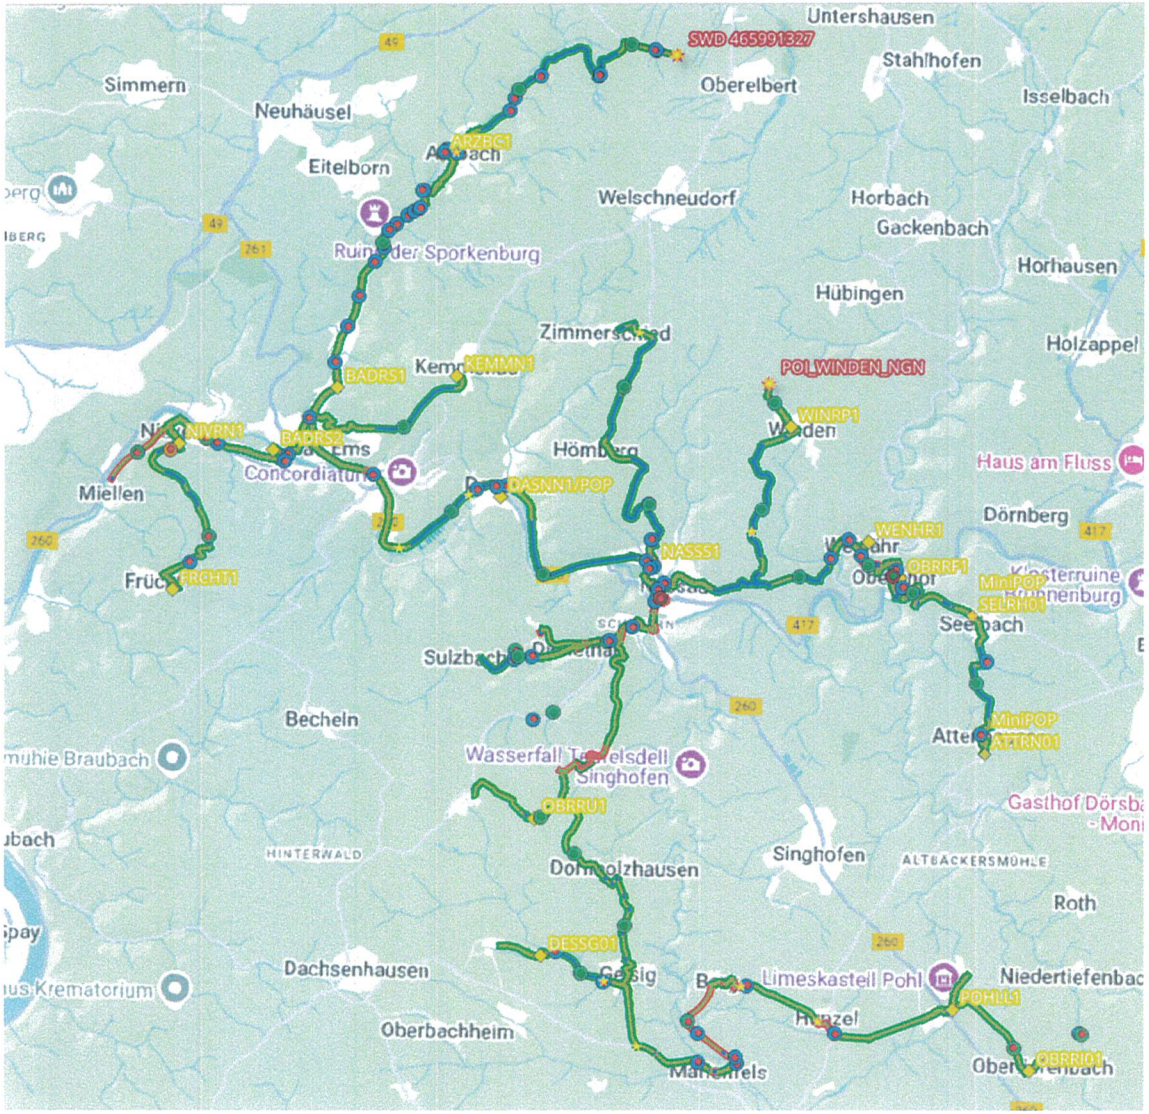

Grün – fertiggestellte Ausgrabung
Blau – fertiggestellte Spülbohrung
Rot – nicht gestartet
Blue/rot punkte - Wasserrechtliche Genehmigung

Phoenixen
We connect.

© 2025 Phoenix Engineering GmbH

Phoenixen

We connect.

Wasserquerungen BZP

Projekt	Wasserquerung	Meter	Dauer	Abhängigkeiten	Start	Ende	Team
NASSSI-WENHRI(BH)	1	50	4	Obernhof,Sehlbach,Attenhausen,Weinähr	29/04/2025	05/07/2025	Team 1
SWD-ARZBCI(BH)	5	530	7	Bad Ems, Arzbach,Dausenau,Frücht,Nievern,Kemmenau,Miellen	08/05/2025	20/05/2025	Team 1
BADRSI-ARZBCI(LBB)	8	450	8	Bad Ems, Arzbach,Dausenau,Frücht,Nievern,Kemmenau,Miellen	19/05/2025	30/05/2025	Team 1, Team 2
NIVRNI-FRCHTI(LBB)	1	60	2	Frücht	23/05/2025	26/05/2025	Team 3
Arzbach Access	4	200	3	Arzbach	26/05/2025	02/06/2025	Team 2, Team 3
BADRS2-NIVRNI	1	50	2	Nievern,Miellen	16/06/2025	17/06/2025	Team 1
WENHRI-OBRRFI(LBB)	2	220	6	Obernhof,Sehlbach,Attenhausen	23/06/2025	30/06/2025	Team 3
DACRNOI-DAHLHOI	4	240	6	Dahlheim	18/06/2025	01/07/2025	Team 1
NASSSI-OBRRUOI(BH)	0	200	4	Oberwies,Geisig,Dessighofen,Schweighausen,Dornholzhausen	01/07/2025	04/07/2025	Team 2
Nassau Access(Lahn)	1	200	3	Sulzbach, Dienenthal ,Schweighausen	01/07/2025	09/07/2025	Team 2
Bad Ems 2 Access	1	50	2	Frücht,Nievern,Miellen	30/06/2025	04/07/2025	Team 3
NASSSI-Dienethal(FN)	3	200	4	Dienenthal,Sulzbach,Misselberg	02/07/2025	04/07/2025	Team 1
Nassau-Pohl(BH)	6	360	2	Marienfels,Berg,Pohl ,Lollschied,Obertiefenbach	10/07/2025	18/07/2025	Team 2
Bad Ems - Dausenau	2	100	3	Dausenau	07/07/2025	11/07/2025	Team 1
Nassau DB	0	200			07/07/2025	09/07/2025	Team 3
Dahlheim - Weyer	3	180	4	Weyer	14/07/2025	17/07/2025	Team 1
Braubach 1 -Braubach 2	7	420	9	Dachsenhausen-Dahlheim	21/07/2025	31/07/2025	Team 2
Nievern DB					18/07/2025	21/07/2025	Team 1
Totals	49	3710	69	-	29/04/2025	31/07/2025	

© 2025 Phoenix Engineering GmbH

Fertigstellung des Projektes

Phoenixen

We connect.

Gemeinde	Cluster	Forecast Jan 25	Forecast Feb 25	Forecast Mar 25	Forecast Apr 25	Forecast May 25	Forecast June 25	Forecast July 25	Forecast Aug 25	Forecast Sep 25	Forecast Oct 25	Forecast Nov 25	Forecast Dec 25
Bad Ems 1	RPI2						RFS						
Bad Ems 2	RPI2								RFS				
Dausenau	RPI2							RFS					
Frücht	RPI2								RFS				
Geisig	RPI2									RFS			
Kemmenau	RPI2						RFS						
Nassau 1	RPI2	Active											
Nassau 2	RPI2									RFS			
Obernhof	RPI2								RFS				
Homberg	RPI2	Active											
Zimmerschied	RPI2	Active											
Winden	RPI2	Active											
Oberwies	RPI2									RFS			
Pohl	RPI2								RFS				
Lollschied	RPI2									RFS			
Arzbach	RPI2						RFS						
Weinähr	RPI2	Active											
Nievern	RPI2								RFS				
Schweighausen	RPI2									RFS			
Attenhausen	RPI2								RFS				
Dienethal	RPI2								RFS				
Dornholzhausen	RPI2									RFS			
Sulzbach	RPI2								RFS				
Miellen	RPI2									RFS			
Misselberg	RPI2								RFS				
Seelbach	RPI2								RFS				
Dessighofen	RPI2									RFS			

© 2025 Phoenix Engineering GmbH
